

实践目标与核心任务

从“有创意”走向“能推进”



实践目标

- 明确团队内部角色与任务分工
- 学会梳理项目推进所需资源与支持条件
- 学会识别项目中的主要风险点
- 在反馈基础上完成第一次方案迭代



重点任务

- 1 团队角色分配
- 2 任务清单制定
- 3 资源清单梳理
- 4 风险识别
- 5 方案迭代优化



成果产出

- 1 团队分工表
- 2 任务进度表
- 3 资源清单
- 4 风险清单
- 5 项目方案V2



团队协作



角色分工



资源配置



风险识别



方案迭代



项目推进



让每个人都知道做什么、何时做、怎么做。



任务导入：为什么项目推进常常卡住？

好想法不等于能落地，问题往往出在协作与推进机制上




常见卡点

- 分工模糊，事情容易重复或遗漏
- 任务不拆解，大家只知道“要做”却不知道“怎么做”
- 资源不清楚，推进时才发现条件不足
- 缺少复盘与反馈，方案停留在初版



为什么要迭代

- 让方案从想法走向可执行
- 在反馈中修正逻辑漏洞
- 逐步补齐资源、进度与风险安排
- 形成更成熟的项目方案V2

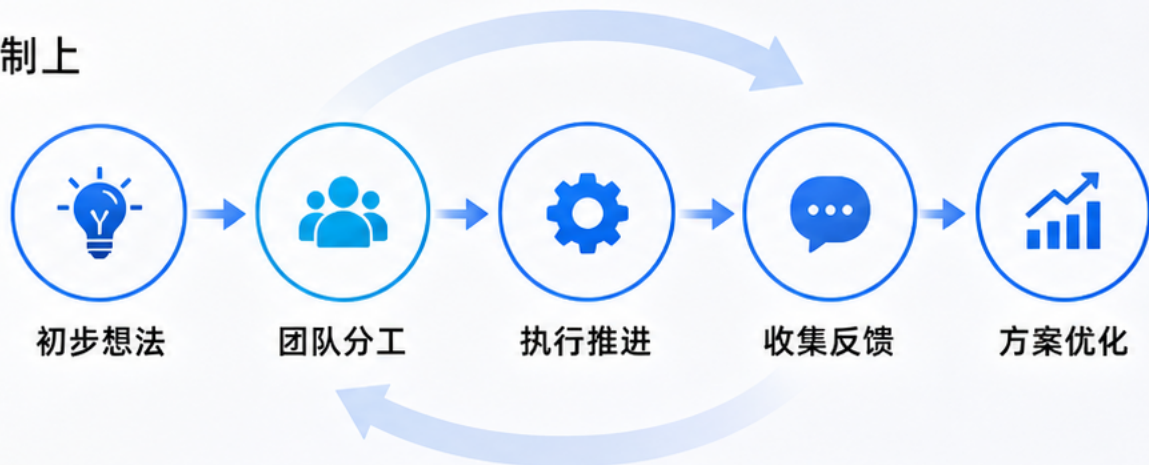

项目不是一次定型，而是在协作中不断变好。



推进机制越清楚，项目越容易落地。



团队角色分配与职责设计

先明确谁负责什么，再进入高效协同



1 项目负责人

统筹目标、分配任务、
把控节奏



2 用户研究负责人

跟进用户信息、反馈整理、
需求验证



3 产品方案负责人

梳理方案结构、明确
功能与流程



4 商业与财务负责人

分析成本、收益、资源
与可行性



5 路演与材料负责人

整理文档、可视化材料、
汇报表达



分工不是分家，而是为了更高效地协同。

协作原则



目标一致



信息同步



定期复盘



互相补位



角色更清楚，协作更顺畅。



任务清单与进度安排

把大任务拆解成可执行、可追踪、可交付的小任务



任务拆解建议

- 1 方案梳理
- 2 用户验证
- 3 资源确认
- 4 风险修订
- 5 汇报材料准备



任务进度表示例

阶段	主要任务	负责人	时间	输出
第1阶段	项目问题与目标梳理	项目负责人	第1周	项目目标卡
第2阶段	用户验证与反馈整理	用户研究负责人	第1-2周	反馈记录
第3阶段	商业模式与资源修订	商业与财务负责人	第2周	修订说明
第4阶段	方案优化与V2整合	产品方案负责人	第3周	项目方案V2
第5阶段	材料汇总与展示准备	路演与材料负责人	第3周	展示材料



工具建议：甘特图 / 看板 / 周例会



把任务拆小，项目推进更可控。



资源清单与支持条件梳理

先看清已有资源与缺口，再判断方案如何落地



人力资源：团队成员能力与可投入时间



信息资源：用户资料、竞品信息、行业案例



工具资源：问卷、表格、画布、AI工具



外部支持：导师建议、同学协助、合作伙伴



场地与时间：讨论空间、调研场景、推进周期



资源清单示例

资源项	当前情况	获取方式
用户反馈样本	不足	补充访谈
竞品资料	基本齐全	继续更新
设计工具	已有	统一模板
导师反馈	待获取	预约交流
路演素材	缺少	分工补充



资源不是越多越好，
而是要与项目目标匹配。



看清资源边界，方案才更可落地。



风险识别与预警设计

提前识别不确定性，避免项目在推进中被动失速



市场风险：用户需求判断偏差



技术风险：功能实现难度高



团队风险：协作效率不足或成员缺位



进度风险：任务拖延导致节点延后



成本风险：预算估计不足



风险清单示例

风险点	可能性	影响程度	应对措施
用户需求不清	中	高	继续访谈验证
技术实现超预期	中	中	缩小首版范围
任务延期	高	中	拆解任务并周跟进
经费不足	低	中	控制首版成本



优先处理高影响、高概率风险。



提前看见风险，才能更稳地推进。



项目方案迭代优化：从反馈到V2

把用户、导师与团队反馈转化为下一轮改进动作



每一次反馈，都是方案升级的机会。



成果样例展示

展示本次实践课建议形成的核心过程性成果

1 团队分工表示例



角色	成员	主要职责
项目负责人	张同学	统筹推进、对接资源、把控进度
市场调研	李同学	用户调研、竞品分析、需求洞察
产品设计	王同学	方案设计、原型制作、体验优化
运营推广	陈同学	推广策略、渠道对接、内容规划
财务与资源	赵同学	成本测算、资源盘点、预算规划

3 资源清单示例



类别	已有资源	缺口资源	获取方式
人力资源	5人团队	专家顾问	校内导师+校友
物质资源	电脑、会议室	测试设备	实验室申请
信息资源	行业报告、文献	竞品数据	公开数据库+调研
资金资源	种子资金1,000元	推广预算	赞助+竞赛基金
渠道资源	校内社群	外部合作渠道	校企合作+社群合作

2 任务进度表示例

任务事项	状态
① 用户调研与需求分析	● 已完成
② 方案设计与原型制作	● 进行中
③ 资源对接与成本测算	● 待完成
④ 风险识别与应对方案	● 未开始
⑤ 项目路演与迭代优化	● 未开始

4 风险清单示例

风险点	等级	应对
用户需求不明确	高	加强访谈与验证，迭代需求
关键资源不足	中	拓展资源渠道，备选方案
技术实现难度大	中	引入技术支持，分阶段实现
推广效果不达预期	中	小范围试投，快速优化调整
成本超预算	低	严格预算管控，动态监控



项目方案V2关注点



逻辑更完整

目标、路径、行动与产出更匹配



执行更清晰

任务可落地、节点可衡量、责任可追踪



资源更匹配

人、财、物、信息、渠道更有保障




风险更可控

识别更全面、分级更合理、应对更可行



把过程材料做扎实，方案升级更有依据。



成果提交要求与评价标准

通过规范提交与课堂评价，推动项目方案完成第一次升级

必交成果

- 1 团队分工表
- 2 任务进度表
- 3 资源清单
- 4 风险清单
- 5 项目方案V2

提交形式

- 电子版文档或PPT截图
- 小组统一命名打包提交
- 材料整洁，分工信息完整



课后延伸任务

- 继续补充反馈信息
- 完善方案V2细节
- 为下一次AI赋能项目诊断做好准备



课堂评价标准（总分100分）

评价维度	权重	评价要点
 分工清晰度	25%	角色明确，职责合理
 任务推进性	25%	计划完整，节奏清楚
 资源与风险分析	25%	识别准确，措施可行
 方案迭代表现	25%	能根据反馈完成优化



下一次实践课将进入
AI赋能项目诊断与原型设计。



迭代越充分，方案越成熟。

